

RN4 – Mise à 2x2 voies

Section St Georges / Héming

**Rencontre Régionale du Transport Routier -
Lorraine - 11 décembre 2018**




PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Grand Est

www.alsace-champagne-ardenne-lorraine.developpement-durable.gouv.fr



PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

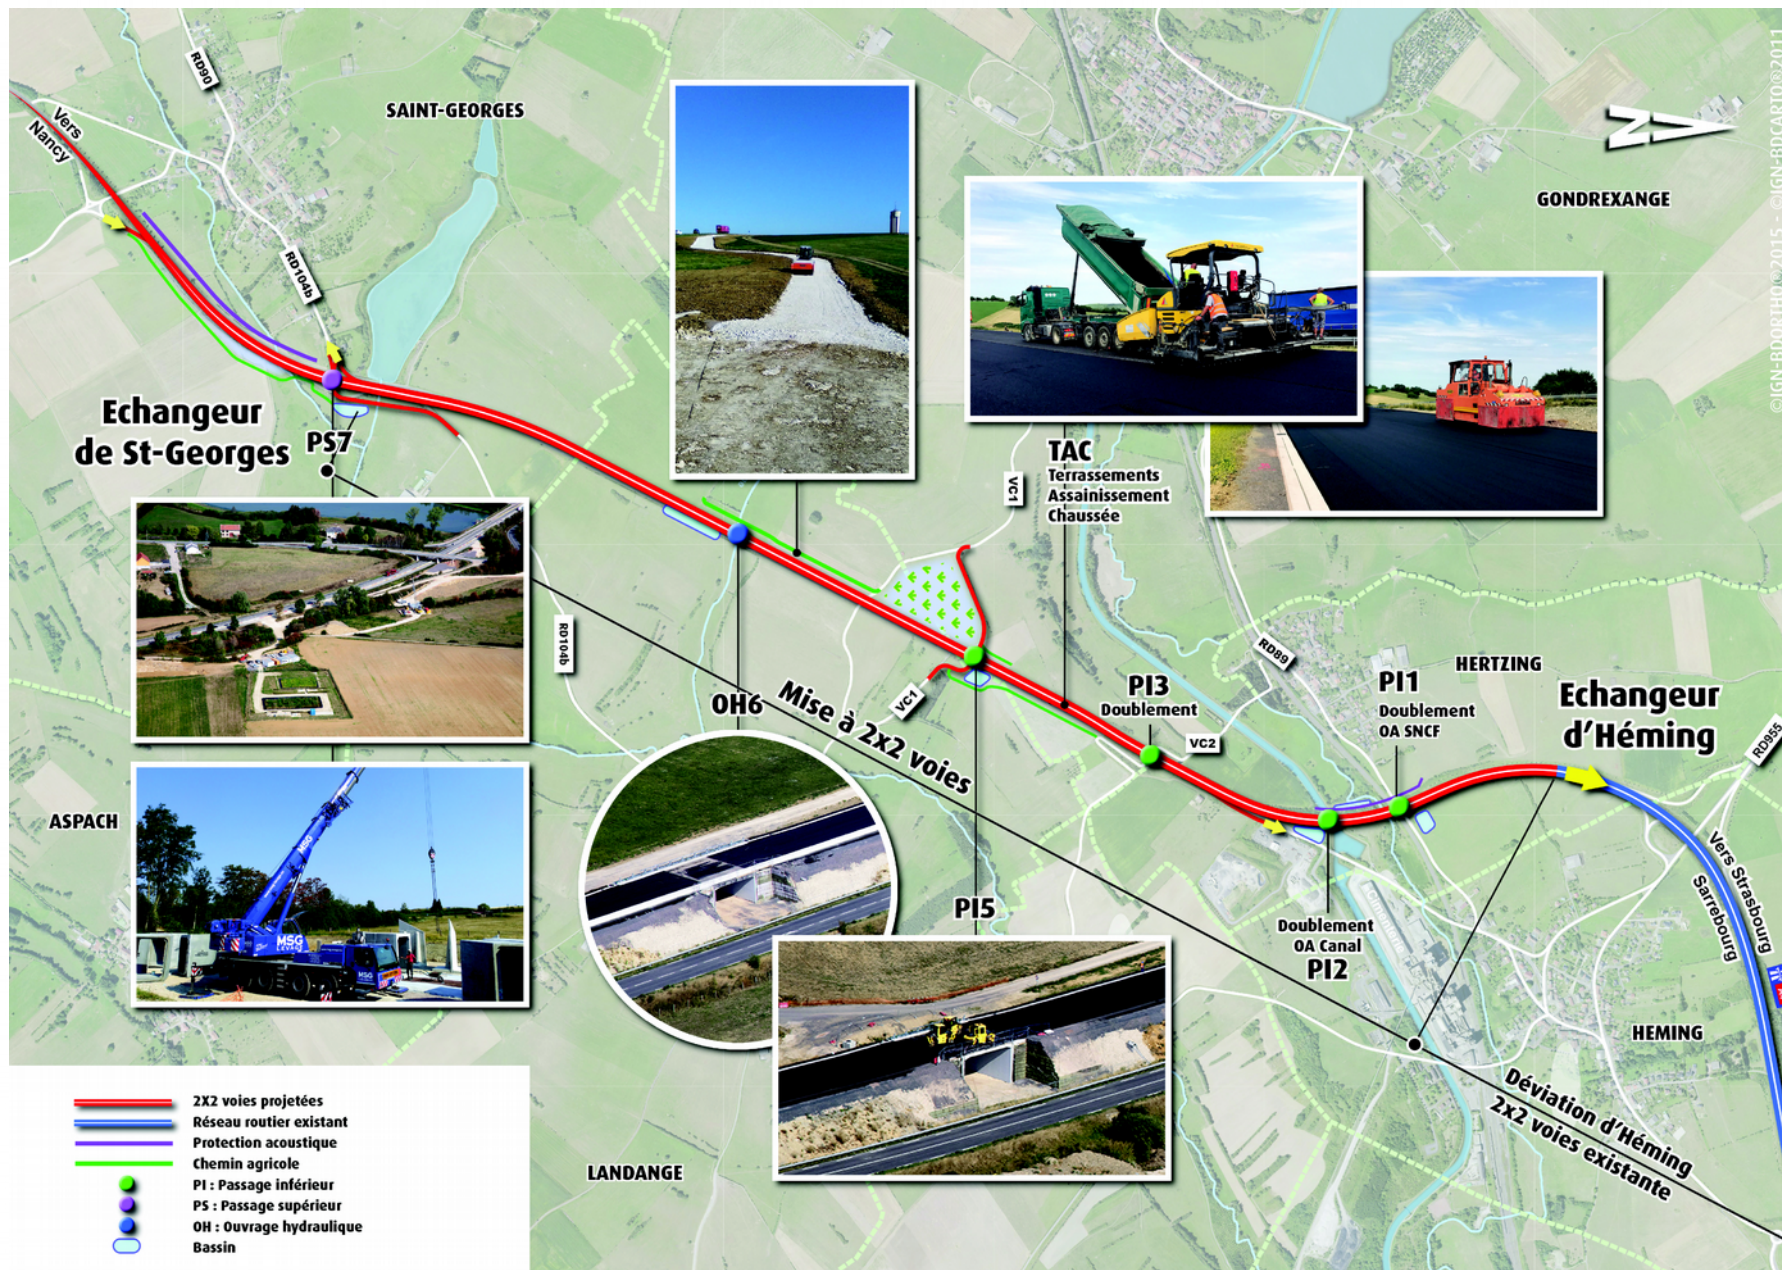

Contexte

- Objectifs :
 - assurer une homogénéité d'itinéraire de la RN4 de Lunéville à Phalsbourg,
 - assurer la fluidité du trafic,
 - améliorer la sécurité des usagers.
- Avancement :
 - Travaux réalisés :
 - Fouilles archéologique, Mesures compensatoires à 70 %
 - OA à 100 % : PI1, PI2, PI3
 - 100 % chemins agricoles
- 2017- 2018 :
 - TAC, PI5 et OH6 de la chaussée Ouest et PS7 et Ohx
 - Équipements de sécurité et signalisation de la chaussée Ouest
- 2019 et 2020 :
 - TAC, PI5 et OH6 et équipements de sécurité et signalisation de la chaussée Est
 - Aménagement paysager et fin de réalisation des mesures compensatoires

État d'avancement



État d'avancement



Terrassement secteur Gondrexange



Terrassement secteur Heming



Construction de Pi5 - secteur Gondrexange



Construction de Oh6 - secteur Gondrexange



Construction d'Oh - secteur St Georges

État d'avancement

Travaux actuellement en cours : chaussée Ouest


- Terrassement,
- Assainissement,
- Chaussée,
- équipements : dispositifs de retenue, signalisations horizontale et verticale.



État d'avancement

Travaux actuellement en cours :

- Aménagement du passage supérieur de la RD104 (PS7)

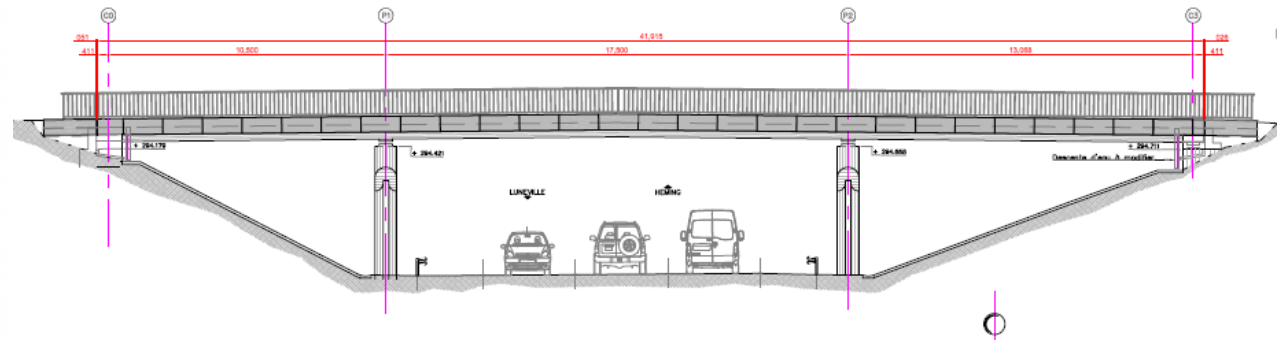

- Création de divers ouvrages hydraulique

